

Point d'exécution à fin juin


BUDGET 2015

VERSION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN SA SESSION DU 18 SEPTEMBRE 2015



Sommaire

4	POINT D'EXECUTION DU BUDGET 2015
5	1. LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES
7	2. LES REALISATIONS DU PROGRAMME D' ACTIONS
8	3. POINT D'EXECUTION DES CHARGES ET PRODUITS
8	a. LES PRODUITS
9	b. LES CHARGES
10	4. LES INVESTISSEMENTS ET PROJETS

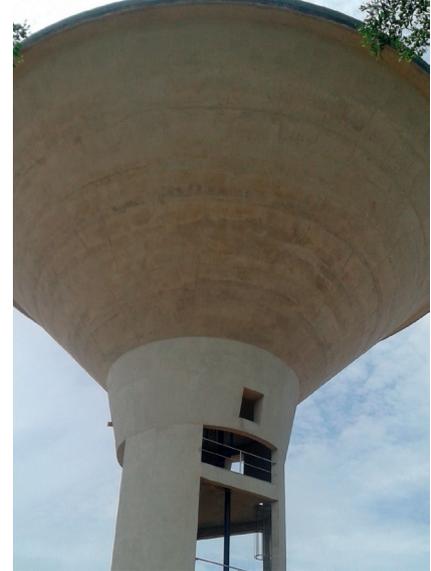

POINT D'EXECUTION DU BUDGET 2015

Le 30 septembre 2014, le Conseil d'Administration a adopté le budget général de la SONEB exercice 2015 qui s'élève, en milliards de FCFA, à 27,92 en produits, 23,20 en charges et 16,91 en investissements.

Dans le cadre de la transmission du projet de budget exercice 2016 au Conseil d'Administration en vue de son adoption, il est élaboré le présent point d'exécution du budget 2015 au 30 juin à titre de compte rendu qui s'articule autour des principales rubriques ci-après :

1. point des objectifs ;
2. synthèse des réalisations technico-commerciales (programme d'actions) ;
3. synthèse du budget d'exploitation (produits et charges) ;
4. synthèse du budget des investissements (investissements courants et projets).



1. LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES

N° d'ordre	Objectifs	Objectifs annuels	Objectifs attendus au 30 juin	Réalisations au 30/06/2015	Taux de réalisation
1	Porter le nombre de clients à 234.000 à fin 2015	234 000	220 088	220 447	100%
2	Augmenter la production d'eau d'au moins 6% (milliers de m3)	47 825	23 913	25 161	105%
3	Réduire d'1 point le taux d'eau non comptabilisée de 2014	23,59%	23,59%	23,91%	99%
4	Assurer la potabilité de l'eau et atteindre un indice de conformité de 100%	100%	100%	100%	100%
5	Améliorer la qualité du service offert à la clientèle et réaliser un taux de satisfaction globale de la clientèle de 65%	65%	65%	86%	132%
6	Accroître le chiffre d'affaires d'au moins 7% (millions de FCFA)	22 469	11 234	11 171	99%
7	Maîtriser les charges en atteignant un taux de couverture des charges d'exploitation d'au moins 104%	104%	104%	Indicateur à calculer en fin d'exercice	-
8	Accroître la productivité du personnel en atteignant les ratios de 4 agents pour 1000 abonnés	4,0	4,0	3,9	103%
9	Améliorer le recouvrement des ventes d'eau (atteindre un taux de recouvrement de 96% pour les clients particuliers)	96%	96%	77%	81%
9 "	Améliorer le recouvrement des ventes d'eau (atteindre un taux de recouvrement de 75% pour l'Administration Centrale)	75%	75%	22%	29%
10	Assurer la sécurisation juridique du patrimoine immobilier et son développement	65%	65%	29%	45%
10 "	Assurer la sécurisation physique du patrimoine immobilier disposant de titres de propriété et des points de captage	80%	80%	91%	114%
		94%	94%	0%	0%
11	Poursuivre les activités relatives à l'assainissement des eaux usées en milieu urbain	-	-	Les activités se poursuivent	-
12	Améliorer la capacité managériale de l'entreprise en atteignant un taux de réalisation du Contrat d'Objectifs de Performances des Responsables Centraux et Départementaux ≥ 85%	85%	85%	75%	88%

L'évaluation des douze (12) objectifs prévus pour être réalisés est faite à l'aide de quinze (15) indicateurs dont 6 sont entièrement atteints, 4 réalisés au moins à 80% et seulement 3 à des taux de réalisation inférieurs à 80%. Les données relatives à deux indicateurs ne sont pas encore disponibles.

Ainsi, le contenu du tableau ci-dessus appelle les commentaires ci-après :

Les objectifs qui ont fait l'objet de performance encourageante sont ceux relatifs à l'eau produite (105% de l'objectif), le nombre d'abonnés (100% de l'objectif), la mesure de la satisfaction des plaintes (132% de l'objectif), la productivité du personnel (103% de l'objectif) et la sécurisation physique du patrimoine immobilier disposant de titres de propriété (114% de l'objectif).

Toutefois, il est à noter que l'indicateur de la satisfaction de la clientèle, mesuré par le traitement des plaintes sera revu d'ici à la fin de l'année à la suite de l'enquête à réaliser par un Cabinet extérieur dont le contrat a été déjà signé et notifié.

- L'objectif du nombre des abonnés est réalisé à 100% (220.447 contre 220.088 prévus pour la période) grâce essentiellement à l'importante campagne de réalisation des branchements à coûts réduits qui a porté le niveau à 14.293 contre 13.057 prévus.
- Le volume d'eau produite au titre de cette période de 2015 est de 25,16 millions de m³, soit un taux de réalisation de 105% des objectifs malgré les difficultés énergétiques enregistrées. La mise en service des 16 nouveaux forages pour l'alimentation de la ville de Cotonou en novembre 2014 y a beaucoup contribué.
- L'objectif de l'Eau Non Comptabilisée est réalisé à 99% et s'établit à 23,9% pour un objectif de 23,6%. Elle sera améliorée avec la mise en œuvre du Projet de réduction des pertes d'eau et d'amélioration de la viabilité des systèmes d'AEP de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomé-

érations prévu pour durer 3 ans à compter de 2016.

- L'objectif du chiffre d'affaires à fin juin est réalisé à environ 100% malgré le niveau relativement bas de tous les autres éléments constitutifs notamment les travaux (60%), les services vendus (87%) et les autres ventes (6%).
- La productivité physique du personnel est réalisée à 103% des objectifs.
- Le recouvrement des ventes d'eau aux clients particuliers est réalisé à 81% de l'objectif. Des résultats positifs permettant d'atteindre voire dépasser l'objectif de 96% fixé au titre de 2015 sont attendus en raison de l'externalisation des opérations de coupure et de remise de la fourniture d'eau courant le dernier trimestre.
- Pour ce qui concerne la sécurisation du patrimoine immobilier, seulement 90 certificats administratifs sur 306 sites sont obtenus, 82 terrains disposant de titres de propriété ont été clôturés sur 90 et 91 points de captage sur 180 sont clôturés en matériaux définitifs. Aussi, est-il important de noter que des levés topographiques ont été réalisés sur 10 domaines acquis courant mai par la SONEB à Zinvié.

Quant aux activités relatives à l'assainissement, elles se poursuivent normalement. La réalisation de l'étude de faisabilité pour la construction de la station de traitement et d'épuration de boues de vidange à Calavi a conduit à l'identification des sites probables devant l'abriter et sont en cours de finalisation. De même, le bureau d'étude devant réaliser les plans directeurs d'assainissement des eaux usées de la conurbation de Cotonou (Abomey-Calavi, Cotonou, Sémé-Podji) et de la ville de Porto-Novo a été sélectionné et ses prestations ont démarré depuis le 24 février 2014. Le rapport d'établissement est disponible.

- La séance d'évaluation des contrats d'objectifs de performance (COP) exercice 2014 et de signature des COP exercice 2015 a eu lieu le 20 mars 2015. Le niveau global de réalisation à mi-parcours est de 75% contre 85%.

2. LES REALISATIONS DU PROGRAMME D' ACTIONS

Les réalisations à fin juin du programme d'actions complètent celles des objectifs et sont résumées dans le tableau synoptique suivant :

Tableau n° 1 : Réalisations du programme d'actions

Rubriques	Unités	Prévisions annuelles 2015 (1)	Objectif attendu au 30/06/2015 (3)	Réalisations au 30/06/2015 (2)	Taux de réalisation (2)/(3)
Eau brute	Milliers m3	49 234	24 617	26 018	106%
Eau traitée	Milliers m3	47 825	23 913	25 161	105%
Eau vendue	Milliers m3	36 546	18 273	19 144	105%
Taux d'eau non facturée	U	23,6%	23,6%	23,9%	99%
Extension exécutée	kml	295	148	74	50%
Branchements réalisés	Unité	26 114	13 057	14 293	109%
Nombre d'abonnés actifs	Unité	234 288	220 088	220 447	100%

A l'exception des extensions exécutées et de l'eau non comptabilisée, les objectifs du programme d'actions sont globalement atteints.

Ainsi, au plan national les prévisions de production d'eau brute et d'eau traitée sont entièrement réalisées respectivement aux taux de 106% et 105%. Les ventes quant à elles, sont réalisées à 105%. Il en résulte un taux d'eau non comptabilisée brut de 23,9%.

Les travaux d'extension sont exécutés au taux de 50% des prévisions de la période. Les extensions payées par les clients sont réalisées à 47% tandis que celles sur fonds propres sont réalisées à 101%. En ce qui concerne les extensions sur fonds propres, on y compte les différents tra-

voux de prolongement du réseau effectués dans les villes de Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Comé, Lokossa, Bohicon, Parakou, Kandi, N'Dali, et Natitingou.

Les branchements attendus sont réalisés à 109%. Les travaux de branchement et d'extension confiés désormais à des entreprises externes sur toute l'étendue du territoire contribuent pour beaucoup dans l'atteinte des objectifs et tous les nouveaux abonnés de la période ont été codifiés et pris en compte dans le système de facturation.

Les réalisations des données du programme d'actions par directions départementales sont présentées à travers le tableau ci-après :

Tableau n°2 : Réalisations du programme d'actions par départements

RUBRIQUES	DD AL	DD OP	DD MC	DD ZC	DD BA	DD AD	TOTAL
EAU POMPEE	17 311 921	2 942 628	1 092 111	1 564 556	2 254 194	852 838	26 018 248
EAU REFOULEE	17 068 377	2 727 257	1 092 111	1 546 415	1 902 009	824 893	25 161 062
EAU VENDUE	12 599 072	2 333 915	838 063	1 169 907	1 542 574	660 714	19 144 245
TAUX DE PERTE DE PRODUCTION %	1%	7%	0%	1%	16%	3%	3,29%
TAUX D'EAU NON FACTUREE %	26%	14%	23%	24%	19%	20%	23,9%
EXTENSION PAYEE (en ml)	14 202	5 776	2 149	1 668	5 502	424	29 721
EXTENSION SUR FONDS PROPRES (en ml)	30 778	11 304	108	300	1 755	342	44 587
EXTENSION SUR PROJET (en ml)	-	-	-	-	-	-	-
BRANCHEMENTS	5 664	2 279	1 829	2 234	1 779	508	14 293
NOMBRE ABONNES ACTIFS	128 648	31 892	11 314	19 050	22 116	7 427	220 447

Des efforts méritent d'être déployés pour la réduction du taux de perte en distribution à la DDAL (26% contre 24% prévu).

3. POINT D'EXECUTION DES CHARGES ET PRODUITS

a. LES PRODUITS

La synthèse des réalisations des produits à fin juin 2015 présentée à travers le tableau n°3 ci-après se limite aux données provenant des exploitations départementales.

Tableau n° 3 : Point d'exécution des produits

Rubriques	Prévisions 2015	Objectif au 30/06/2015 (1)	Réalisations au 30/06/2015 (2)	Taux de réalisation (2)/(1)
VENTES EAU HT	18 455	9228	9 816	106%
TRAVAUX VENDUS	2 542	1271	762	60%
SERVICES VENDUS	1 350	675	590	87%
AUTRES VENTES	122	61	4	6%
CHIFFRES D'AFFAIRES	22 469	11234	11 171	99%
PRODUCTION IMMOBILISEE	419	210	187	89%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	22 888	11444	11 358	99%

(Montants en millions FCFA)

Les produits d'exploitation sont réalisés à environ 100% grâce essentiellement aux ventes d'eau. Il s'en dégage un prix moyen de 513 F/m3 contre 505 F/m3 budgété.

Les travaux vendus sont exécutés en valeur à 60% de l'objectif à fin juin 2015.

La production immobilisée constitue la contrepartie comptable des extensions sur fonds propres. Son niveau d'exécution par rapport aux objectifs de la période est de 89%. Ce résultat globalement satisfaisant par rapport aux années antérieures (13% en 2013 et 41% en 2014) découle d'une part de la disponibilité du matériel au cours de la période et d'autre part de l'externalisation desdits travaux.

b. LES CHARGES

En raison des rubriques de charges calculées en fin d'exercice telles que les charges provisionnées, les dotations aux amortissements et provisions, le présent point se limite aux charges décaissables hors impôts BIC.

Tableau n° 4 : Point d'exécution des charges décaissables hors BIC

Rubriques	Prévisions 2015	Objectif au 30/06/2015	Réalisations au 30/06/2015	Taux d'exécution
ACHATS DE MATERIELS ET FOURNITURES	6 267	3 133	3 724	119%
TRANSPORTS	60	30	11	38%
SERVICES EXTERIEURS A	1 324	662	596	90%
SERVICES EXTERIEURS B	1 230	615	329	54%
IMPOTS ET TAXES	435	300	252	84%
AUTRES CHARGES	1 353	677	6	1%
CHARGES DE PERSONNEL	5 672	2 836	2 462	87%
CHARGES FINANCIERES	572	244	303	124%
TOTAL DES CHARGES DECAISSABLES	16 913	8 496	7 684	90%

(Montants en millions FCFA)

Les charges décaissables sont réalisées à 90% des objectifs attendus à fin juin 2015 et à 45% des objectifs de l'année.

Ainsi, l'analyse des postes importants constituant ces charges appelle les commentaires ci-après :

Les « achats de matériels et fournitures » sont réalisés à 119% grâce au niveau très satisfaisant du poste « achat de matériels de branchement et d'extension » composant cette rubrique qui est de 223% des objectifs attendus pour la période. Les acquisitions prises en compte pour la

période concernent un marché de 13.500 kits de branchement, des manchons coulissants, un marché de tuyaux, du matériel de maintenance hydraulique, des accessoires de branchement à utiliser dans le cadre du remplacement des compteurs âgés, diverses pièces de rechange pour la réparation des groupes et des pompes sur les forages ainsi que divers joints. La chaux éteinte, l'hypochlorite de calcium, diverses pièces de rechange électriques et d'ordinateur ainsi que des pneus pour le matériel roulant ont été également acquis.

Les « transports » sont réalisés à 38%. Ce faible

niveau est surtout lié à la quasi inexistence des activités de transport de matériel et de produits de traitement par les tiers ainsi que la rareté des missions du personnel à l'extérieur au cours de la période. Seules les participations de la SONEB à la réunion statutaire de l'AAE à Bamako, à la 57ème session sur la commission mixte de coopération entre le Bénin et les entités franco-phones de Belgique, au benchmarking et gestion des projets organisés par la Société Wallonaise Des Eaux ainsi que les indemnités de transport dans le cadre des affectations des agents ont été enregistrées.

Les « services extérieurs A » sont réalisés à 90%. La maintenance du système informatique et des interconnexions des liaisons BLR/VSAT, les différents travaux de dépannage, de branchement et d'extension dans toutes les Directions Départementales; l'entretien de la pompe de reprise de Bohicon, le paiement des indemnités de fin de carrière du premier semestre, la maintenance du matériel d'incendie à la Direction Générale et à la DDAL, la location de camion-grue pour démonter et remplacer des pompes immergées à la DDMC et à la DDOP ainsi que le renouvellement de l'assurance du parc automobile constituent entre autres, les dépenses effectuées sur cette ligne. Les dépenses d'entretien des sources de captage à Okpara et Savalou, le renouvellement de l'assurance maladie du personnel ainsi que les factures de téléphone conventionnel ne sont pas encore entièrement exécutées.

Quant aux « services extérieurs B », ils sont réalisés à 54% des prévisions de la période. On y compte entre autres l'évaluation du projet de Cotonou phase II, l'organisation de la rencontre entre les membres de la GIZ et KFW et les Représentants des communes dans le cadre du programme AEP et assainissement de la conurbation de Cotonou, des prestations relatives à la réalisation des inventaires physique et exhaustif des immobilisations, au contrat avec l'avocat – conseil et les notaires, au conseil fiscal et aux travaux de commissariat aux comptes ainsi qu'aux différentes formations organisées pour le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des marchés publics. Les frais relatifs à la part de

la SONEB au titre de cotisation de l'année 2015 pour l'AAE et les frais relatifs à la cérémonie de distinction de certains agents de la SONEB sont également pris en compte sur cette rubrique.

Les diverses études : cartographie des risques, apurement du portefeuille client, élaboration du schéma directeur et audit informatique sont entre autres celles qui ne sont pas encore engagées.

Les « charges de personnel » pour la période sont réalisées à 87%. Il est à noter que la contractualisation d'une partie de la main d'œuvre occasionnelle initialement prévue a été effective et prise en compte sur cette rubrique depuis le début de l'année.

En ce qui concerne les « charges financières », l'échéance de paiement des intérêts sur l'emprunt BOAD est honorée conformément aux prévisions budgétaires pour un montant de 194 millions FCFA. Quant à l'emprunt BEI, 102 millions ont été payés dans le cadre des intérêts intercalaires concernant le projet de renforcement du système d'AEP de Cotonou phase II. De même, dans le cadre de l'encaissement partiel du don des Pays-Bas, 4 millions FCFA ont été également payés à la CAA au titre de commission de rétrocession. Aussi, des intérêts de 3 millions générés par les comptes bancaires des projets de l'Union Européenne et utilisés précédemment pour régler les décomptes des prestataires ont été reversés.

4. LES INVESTISSEMENTS ET PROJETS

Les investissements et projets sont composés des investissements courants, des projets financés sur les ressources extérieures (Budget National et Partenaires Techniques et Financiers) et des projets réalisés entièrement sur fonds propres. Ils sont engagés au taux global de 27% des prévisions annuelles.

Le détail de l'exécution du budget des investissements se présente comme suit :

Tableau n° 5 : Synthèse du point d'exécution des investissements et projets.

Rubriques	Prévisions 2015	Réalisations au 30/06/2015	Taux d'exécution
FRAIS DE RECHERCHE	145	12	8%
BREVETS LICENCES ET LOGICIELS	64	3	5%
TERRAINS	175	25	14%
BATIMENTS & AMENAGEMENTS BUREAUX	193	31	16%
INSTALLATIONS TECHNIQUES	805	195	24%
MATERIELS ET OUTILLAGES	811	744	92%
MATERIELS ET MOBILIERS	260	72	28%
MATERIELS DE TRANSPORT	316	33	10%
TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS	2 770	1 114	40%
PROJETS AEP	12 745	3 256	26%
PROJETS ASSAINISSEMENT	1 390	196	14%
TOTAL PROJETS	14 135	3 452	24%
TOTAL GENERAL DES INVESTSSEMENTS ET PROJETS	16 905	4 566	27%

(Montants en millions FCFA)





Les investissements courants sont engagés à 40% des prévisions de 2015.

Les réalisations par rubrique affichent des taux de consommations divers :

- Les « frais de recherche » exécutés à 8% concernent les études d'impact environnemental approfondies réalisées au titre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Parakou et des études hydrogéologiques réalisées à Boukoubé en vue de la réalisation des forages.
- Les engagements liés aux « terrains » sont relatifs aux 10 domaines acquis à Zinvié pour abriter les ouvrages du projet de renforcement du système d'AEP de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs ainsi qu'à leur levé topographique. Ils sont réalisés à 14%.
- Les « bâtiments et aménagements de bureaux » : la consommation s'élève à 16% et concerne la réalisation des travaux :
 - de badigeonnage de l'usine d'eau de Ouando à la DDOP;
 - de Construction de toilettes à 2 kilos à la DDBA et
 - d'érection d'une clôture sur le domaine de la SONEB à Sémé-Podji.
- L'alimentation en énergie solaire de la station d'eau d'Ifangni et de quelques guichets de Cotonou et Porto-Novo, la réhabilitation du réseau de Bonou, l'installation et le déplacement du pylône du guichet de Kindonou et de ceux du Magasin Central, de PK6, de Sémé, de Cocotomey, d'Adjarra, de Calavi, de Comé et de Dogbo, le réaménagement de la tour de prise de l'Okpara ainsi que l'acquisition de matériel de maintenance électromécanique et hydraulique ont porté le niveau d'exécution des « ins-

tallations techniques » à 24%.

- La rubrique « matériel de transport » est exécutée à 10%. L'engagement d'avenant au marché de CAMIN relatif à l'acquisition d'un véhicule 4X4 Ford constitue l'unique réalisation dans cette rubrique, tous les autres lots constituant le marché étant rendus infructueux.
- Les « matériels et outillages » sont réalisés à 92%. On y compte 60 terminaux de saisie portable pour la célérité dans les activités de facturation, des robinets vannes, 13.500 compteurs d'eau ainsi que des compteurs pour le remplacement de ceux âgés de plus de 30 ans encore en exploitation chez les abonnés dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du remplacement des compteurs âgés.
- « Matériels et mobilier de bureau » : 24 ordinateurs de bureau pour la gestion clientèle, des ordinateurs portables en plus de quelques imprimantes, des unités centrales, des bureaux et fauteuils roulants ont porté cette rubrique à 28%.

Les projets ont globalement connu un taux d'exécution financière de 24%. Précisons que, contrairement aux investissements courants, ce taux est évalué sur la base des décaissements réels effectués sur chaque projet. Il est également important de noter que ce taux aurait été meilleur si des difficultés n'avaient pas amené le Royaume des Pays-Bas à suspendre la mise à disposition des ressources d'une part et si le retard et la non disponibilité n'avaient été observés dans l'ordonnancement des crédits par le budget national d'autre part.

Ils sont synthétisés dans le tableau suivant :

TITRE DU PROJET	PROGRAMMATION 2015	REALISATIONS	TAUX
-----------------	-----------------------	--------------	------

PROJETS ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

Projet de Renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations: phase II	1 500 000	788 132	53%
Projet d'alimentation en eau potable des villes secondaires : Comè, Grand-Popo, Malanville, Kétou et Bantè.	720 000	690 000	96%
Projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs (Études techniques détaillées et réalisation des forages).	337 688	277 027	82%
Acquisition de matériels de branchements	276 057	0	0%
Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Porto-Novo dans le cadre de la fête de l'indépendance de 1er août 2010 : Avenants pour le raccordement de Sèmè (Solde restant à payer)	134 290	15 989	12%
Travaux de protection du déversoir latéral et de renforcement de la voie sur la digue du barrage de Kpassa sur l'Okpara.	657 859	0	0%
Projet d'amélioration de l'accès des couches défavorisées de la population urbaine à l'eau par les branchements à coûts réduits (Confère Cadre d'Accélération des OMD).	676 376	202 913	30%
Travaux de remplacement de la conduite DN 500 du tronçon carrefour Vêdoko et l'étoile rouge à Cotonou : Pose d'environ 3,7 km de conduites PEHD 710 et accessoires.	911 735	325 046	36%
Travaux de réhabilitation des châteaux d'eau de 1750 m3 de Vêdoko, de Maro militaire, d'Akpakpa et de Porto-Novo.	191 443	207 011	108%
Projet de renforcement des systèmes d'AEP DU Centre secondaire de Djougou et des localités de Tchaourou Tanguiéta et Savè	5 839 911	749 678	13%
Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Parakou	1 500 000	0	0%
TOTAL	12 745 358	3 255 796	26%

PROJETS ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Projet de construction d'une station de traitement des boues de vidange à Abomey-Calavi	260 000	58 315	22%
Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) : Appui à la gestion des eaux usées	1 129 812	137 790	12%
TOTAL	1 389 812	196 105	14%
TOTAL GENERAL DES PROJETS	14 135 170	3 451 900	24%

(Montants en millions FCFA)

On retiendra au titre de ces projets, que les réalisations physiques renseignant sur l'évolution globale desdits projets depuis leur mise en œuvre se résument comme suit :



Projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Cotonou et ses agglomérations -phase II.

Le rapport définitif sur l'enquête marketing des branchements est disponible ainsi que les rapports définitifs des APD des travaux à exécuter. Les études hydrogéologiques et environnementales ainsi que le contrôle des travaux d'exécution des forages à Ouèdo sont achevés par le cabinet TERRABO. La réception définitive des travaux prévus au niveau des 16 forages a été prononcée et les matériels de 7000 kits de branchement prévus sont livrés et réceptionnés. Les travaux prévus et répartis en 6 lots : lot 2.1 (équipement des forages), lot 3 (pose de conduites de refoulement), lot 4 (construction de station de traitement /pompage), lot 5.1 et lot 5.2 (pose de conduites des réseaux de distribution primaire et secondaire), et lot 8 (construction de château d'eau de 1 750 m³) sont achevés et l'ensemble des équipements est fonctionnel depuis fin Novembre 2014. Le constat d'achèvement des travaux d'équipement des forages est en cours de préparation et les prestations de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la mission de maîtrise d'œuvre sont achevés.

Le taux d'exécution physique global du projet est de 99%.

Projet d'AEP des villes secondaires Comé, Grand-Popo, Malanville, Kétou et Bantè :

Ce projet est exécuté en deux phases.

La 1ère phase réalisée en maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée à l'AGETUR SA dont les prestations sont achevées. Elle a permis de – finaliser le rapport des études techniques ainsi que le DAO des travaux – réaliser les travaux du lot 2 relatifs à la fourniture et l'installation des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques qui sont réceptionnés provisoirement depuis mai 2013 – exécuter huit (08) nouveaux forages à Comé, Kétou, Bantè et Malanville dont la réception provisoire a été prononcée depuis janvier 2013.

En vue de rester dans la même logique que la procédure engagée de-



puis la 1ère phase, la 2ème phase de ce projet est également réalisée en maîtrise d'ouvrage déléguée par l'AGETUR SA. Cette phase est consacrée à la réalisation du lot 1 portant sur la fourniture et la pose de conduites et accessoires et aux ouvrages de génie civil. Dans ce cadre, l'actualisation des études techniques est achevée, la remise de site a déjà eu lieu et les travaux ont démarré le 02 septembre 2014. Les travaux d'implantation des nouvelles conduites à poser ont démarré et sont en cours dans toutes les villes du projet. La construction du château d'eau de Kandi est également en cours d'exécution et la réception en usine des tuyaux et équipements électromécaniques a eu lieu le 23 octobre 2014 et les 05 et 06 février 2015. Toutefois, notons au titre de ce projet la difficulté observée dans la mise à disposition des ressources par le Royaume des Pays-Bas.

Projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs (Etudes techniques détaillées et réalisation des forages)

Les rapports définitifs des études hydrogéologiques et géophysiques sont disponibles et les prestations de contrôle et surveillance des travaux d'exécution des forages sont en cours. Les contrats de l'entreprise FORAG-SA sélectionnée pour la réalisation des deux lots (lot 1: exécution de 07 forages ; lot 2 : réalisation de 03 forages et 02 piézomètres) ont été approuvés respectivement les 06 février et 13 mars 2015. Les travaux du lot 1 sont en cours d'exécution et ceux du lot 2 sont en phase de démarrage.

Projet d'acquisition de matériels pour la réalisation de branchements particuliers :

Les dossiers techniques des matériels et équipements ont été approuvés par la SONEB et la réception en usine a été effectuée du 4 au 13 avril 2014. La livraison a été faite au cours du mois de juin 2014 et la réception au magasin central de la SONEB a eu lieu le 16 septembre 2014. Déclaré inéligible par le bailleur (le Royaume des Pays-Bas), le marché passé dans le cadre de ce projet est désormais entièrement financé par la SONEB.

Projet de Renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Porto-Novo dans la cadre de la fête de l'indépendance de 1er août 2010: avenants pour raccordement de Sèmé au système d'AEP de Porto-Novo.

La réception définitive des travaux a eu lieu le 07 octobre 2014. Le paiement de la facture de retenue de garantie n'a pas encore eu lieu jusqu'à ce jour pour insuffisance des ressources mises à disposition à cet effet. La difficulté à ce niveau concerne le non paiement des décomptes

finaux de l'entreprise et du bureau de contrôle faute d'insuffisance de crédit chargé.

Travaux de protection du déversoir latéral et de renforcement de la voie sur la digue du barrage de Kpassa sur le fleuve Okpara

Le contrat du bureau en charge du contrôle des travaux est en cours de signature et ces travaux sont en cours d'exécution.

Projet d'amélioration des couches défavorisées de la population urbaine à l'eau par les branchements à coûts réduits (confère cadre d'accélération des OMD) :

L'entreprise devant fournir les matériels est sélectionnée et le contrat est déjà signé et enregistré. Les prestations de ce fournisseur sont en cours. Toutefois, la facture de démarrage n'a pu être ordonnancée à ce jour malgré l'achèvement de toute la procédure.

Travaux de remplacement de la conduite en amiante ciment DN 600 du tronçon carrefour Védoko et Etoile rouge à Cotonou : pose d'environ 3,7 km de conduites PEHD 710 et accessoires :


L'avenant n°1 au contrat de prestation du groupement IGIP Gmgh / IGIP Afrique a été approuvé le 07 mars 2014. Le rapport définitif des études techniques détaillées des travaux entrant dans ce cadre est disponible. Les projets d'avenant pour la réalisation de ces travaux sont approuvés, et les différents travaux prévus ont démarré depuis le 02 septembre 2014 et sont en cours. Les prestations de contrôle et surveillance des travaux sont également en cours.

Travaux de réhabilitation des châteaux d'eau de 1750 m3 de Védoko, de Maro militaire, d'Akpakpa et de Porto-Novo

L'avenant n°1 au contrat de base de SOGEA-SATOM, chargé de réaliser les travaux a été approuvé le 1er septembre 2014 et les travaux démarrés depuis le 12 septembre 2014 sont en cours.

Projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè, Tchaourou et Tanguéta

Démarrés le 29 mars 2014, quatorze (14) forages positifs ont été exécutés à Djougou (Débit total 175 m3/h contre 150 m3/h attendu), deux (02) à Tanguéta (Débit total 34 m3/h contre 20 m3/h attendu) et deux (02) à Tchaourou (Débit total 40 m3/h contre 10 m3/h attendu). Le contrôle et la surveillance des travaux dans les localités de Djougou, Tchaourou et Tanguéta sont achevés. Les études techniques détaillées complémentaires ainsi que l'étude d'impact environnemental et social

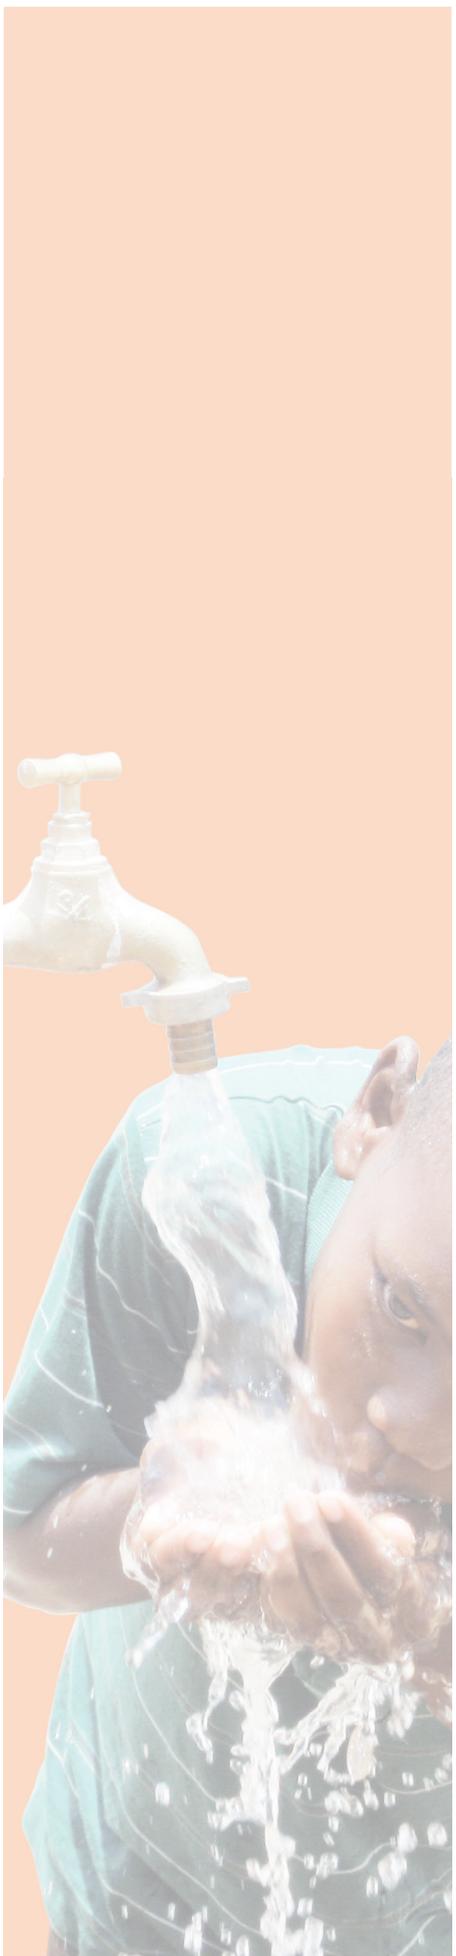

sont achevées. L'ouverture des plis relatifs à la fourniture de matériels de branchements particuliers et de travaux d'aménagement, d'équipement électrique et électromécanique ont déjà eu lieu et les travaux d'évaluation des offres sont en cours de validation par la BOAD. L'appel d'offres relatif à la fourniture d'un véhicule 4X4 a été infructueux. Celui pour l'acquisition des matériels informatiques a été relancé et l'ouverture est prévue pour le 09 juin 2015. Les travaux de fourniture du matériel et pose de conduites et accessoires ont démarré le 27 avril et sont en cours. La livraison des tuyaux est prévue pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2015.

Projet de renforcement du système d'Alimentation en Eau Potable de la ville de Parakou

Le dossier d'Appel d'Offres en vue de la sélection du maître d'œuvre devant réaliser les études d'APD et le contrôle des travaux a été élaboré et est en cours d'examen à la BOAD.

Projet de construction d'une station de traitement de boues de vidange à Abomey-Calavi

L'étude de faisabilité du projet est en cours et le rapport provisoire de la phase des conceptions techniques est disponible. L'atelier de validation dudit rapport est prévu pour le 07 mai 2015. La principale difficulté de ce projet est le retard dans la mise à disposition du site devant abriter la station.

Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) Composante C

Appui à la gestion des eaux usées. Ce projet est mis en œuvre en maîtrise d'ouvrage déléguée par l'AGETUR SA. Les prestations démarrées par la mission d'assistance technique se poursuivent. Le bureau d'étude devant réaliser les plans directeurs d'assainissement des eaux usées de la conurbation de Cotonou (Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè-Podji) et de la ville de Porto-Novo a été sélectionné et ses prestations ont démarré le 24 février 2014. Le rapport d'établissement est disponible. Les formations des acteurs du sous-secteur de l'assainissement ont démarré et se poursuivent. Le dernier atelier est en cours de préparation. Le matériel informatique prévu pour être acquis est déjà livré et réceptionné le 07 novembre 2014. Les rapports définitifs des missions A (collecte des données et diagnostic de la situation actuelle), B (synthèse des données de base et critères de conception) et C (étude des scénarii) sont disponibles et sont validés par le comité de pilotage le 29 avril 2015. Deux ingénieurs Eau et Assainissement ont été recrutés pour renforcer l'effectif du personnel.





soneb
